



PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem

Předkladatel nabídky: **D PLUS – PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

Sídlo: **Sokolovská 16/45 A, 186 00 Praha 8**

Právní forma: **akciová společnost**

IČO: **26760312**

DIČ: **CZ 26760312**

Oprávněň jednat: **Ing. Karel Janoch – předseda představenstva**

Zpracovatelé nabídky: **Ing. Jan Beneš, Iva Zelenková**

Tel.: **221 873 111**


Fax: **221 873 247**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Praha 1**

Číslo účtu: **581094323/0300**

Datum zpracování nabídky: **Leden 2014**

Nabídka na výkon technického dozoru investora

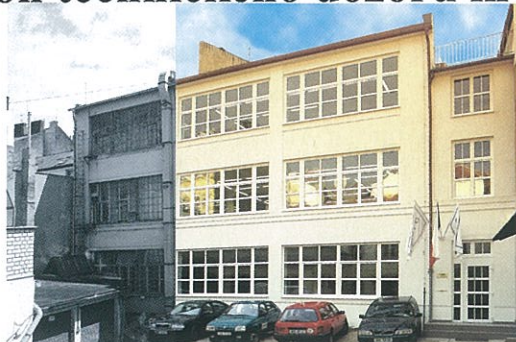

Obsah nabídky

A. Krycí list nabídky:	
• Krycí list nabídky	4
B. Identifikace uchazeče:	
• Identifikace uchazeče	6
C. Doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace:	
• Čestná prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritériích	8
• Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti	12
• Čestné prohlášení podle § 68, odst. 3	13
• Výpis z obchodního rejstříku	14
• Výpis z živnostenského rejstříku	17
• Autorizace – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	19
• Seznam významných služeb	20
• Profesní životopisy	21
• Prohlášení o zaměstnancích	29
D. Jistota:	
• Doklad o složení jistoty	31
E. Nabídková cena:	
• Nabídková cena	33
F. Mandátní smlouva:	
• Mandátní smlouva	35

Krycí list nabídky

Identifikační údaje uchazeče:

a) Právnícké osoby

Obchodní firma nebo název:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	26760312
DIČ:	CZ 26760312
Členové statutárního orgánu:	Ing. Karel Janoch, předseda představenstva Ing. Miroslav Douša, místopředseda představenstva Ing. Martin Jedlička, člen představenstva
Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (doložit originál či úředně ověřenou kopii dokladu o takovém oprávnění):	
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Beneš, obchodní oddělení
Adresa:	Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8
Telefon/fax:	221 873 242 / 221 873 247
E-mail:	jan.benes@d-plus.cz

V Praze dne 14. 1. 2014

d plus ④
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8Ing. Karel Janoch
Předseda představenstva

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní jméno:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo:	Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8
IČO:	26760312
DIC:	CZ 26760312
Statutární orgán:	Ing. Karel Janoch – předseda představenstva Ing. Miroslav Douša – místopředseda představenstva Ing. Martin Jedlička – člen představenstva
Telefon:	221 873 111
Fax:	221 873 247
e-mail:	d-plus@d-plus.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Praha 1
Číslo účtu:	581094323/0300

Čestné prohlášení

**ke splnění základních kvalifikačních předpokladů § 53 bod. 1 dle zákona
č. 137/2006 Sb. v platném znění („zákon“)**

Uchazeč D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 čestně prohlašuje, že je uchazečem:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,
- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, podle zvláštních právních předpisů,
- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekálé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- který není v likvidaci,
- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a nemá ani nedoplatky na spotřební dani,
- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V Praze dne 14. 1. 2014


d plus [®]
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8
Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

**Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií
podle § 53, odst. 1, písm. a), b), i) podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění**

Prohlašuji tímto čestně:

- že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,
- že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání společnosti D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. podle zvláštních právních předpisů,
- že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem zakázky.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako předseda představenstva a odpovědný zástupce pro živnost Projektová činnost ve výstavbě a Inženýrská činnost v investiční výstavbě

V Praze dne 14. 1. 2014


Ing. Karel Janoch

**Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií
podle § 53, odst. 1, písm. a), b), i) podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění**

Prohlašuji tímto čestně:

- že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,
- že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání společnosti D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. podle zvláštních právních předpisů,
- že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem zakázky.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako místopředseda představenstva a generální ředitel

V Praze dne 14. 1. 2014

Ing. Miroslav Douša


**Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií
podle § 53, odst. 1, písm. a), b), i) podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění**

Prohlašuji tímto čestně:

- že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,
- že jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání společnosti D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. podle zvláštních právních předpisů,
- že jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem zakázky.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako člen představenstva a odpovědný zástupce pro živnost Projektová činnost ve výstavbě a Inženýrská činnost v investiční výstavbě

V Praze dne 14. 1. 2014



Ing. Martin Jedlička

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Čestně prohlašujeme, že společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. (IČO: 26760312) je finančně i ekonomicky způsobilá splnit veřejnou zakázku na výkon TDI pro akci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“, která byla vypsána Obcí Psáry dne 30. 12. 2013.

V Praze dne 14. 1. 2014

d plus ©
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8


Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

Čestné prohlášení

podle § 68 odst. 3 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění („zákon“)

Uchazeč D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., Sokolovská 16/45A, 186 00
Praha 8 čestně prohlašuje, že je uchazečem:

- jehož žádný člen statutárního orgánu v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele;
- který má formu akciové společnosti, má pouze akcie na jméno a jejich jediným držitelem je Ing. Miroslav Douša;
- který neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V Praze dne 14. 1. 2014

d plus ④
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 8111

Datum zápisu:	13. února 2003
Spisová značka:	B 8111 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sídlo:	Praha 8 - Karlín, Sokolovská č.p. 45, PSČ 180 00
Identifikační číslo:	267 60 312
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě inženýrská činnost v investiční výstavbě činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců realitní činnost zprostředkování obchodu velkoobchod Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Statutární orgán - představenstvo:	místopředseda představenstva: Ing. Miroslav Douša, dat. nar. 15. července 1955 Praha 6, Šárecká 923/55, PSČ 160 00 den vzniku funkce: 9. ledna 2012 den vzniku členství: 31. prosince 2011 člen: Ing. Martin Jedlička, dat. nar. 19. dubna 1948 Praha 8, Písečná 447 den vzniku funkce: 13. února 2003 předseda: Ing. Karel Janoch, dat. nar. 10. července 1964 Praha 10, Černokostelecká 101/32 den vzniku funkce: 13. února 2003
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.
Dozorčí rada:	člen dozorčí rady: Jindřich Sláma, dat. nar. 24. června 1974 Praha 8, Brigádnická 404/10, PSČ 182 00 den vzniku členství: 31. prosince 2011 člen dozorčí rady: Kateřina Kovandová, dat. nar. 26. května 1976

Praha 8, Svídnická 514, PSČ 181 00
den vzniku členství: 4. září 2006

předseda dozorčí rady:

JUDr. MICHAL CHRŮMA, Ph.D., dat. nar. 25. července 1973
Domažlická 1052/13, Žižkov, 130 00 Praha 3
den vzniku funkce: 4. září 2006
den vzniku členství: 6. prosince 2004

Akcie: 130 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 250 000,- Kč

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 190 000,- Kč

Základní kapitál: 32 690 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti: Odštěpné závody:
Označení: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. -
odštěpný závod Plzeň
Umístění: Plzeň, Alej Svobody 56, PSČ: 323 18
Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
inženýrská činnost v investiční výstavbě
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a
ekonomických poradců
realitní činnost
zprostředkování obchodu
velkoobchod
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy u fyzických a
právnických osob
Vedoucí organizační složky:
Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Pavel Doležal, r.č. 540218/0190
Plzeň, Manětinská 10, PSČ 320 00
Označení: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. -
odštěpný závod Olomouc
Umístění: Olomouc, Jeremenkova 28/221, PSČ : 779 00
Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
inženýrská činnost v investiční výstavbě
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a
ekonomických poradců
realitní činnost
zprostředkování obchodu
velkoobchod
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy u fyzických
a právnických osob
Vedoucí organizační složky:
Vedoucí odštěpného závodu: RNDr. Ing. Čestmír Kučera, r.č.
470610/410
Továř 180, PSČ 783 16
Na společnost D - PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

přešlo na základě sloučení jmění zanikající společnosti D Plus - projektový a inženýrský podnik, spol. s r.o., IČ 645 82 001, se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40990.

Rozhodnutím ze dne 12.9.2007 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je postupné omezování úvěrů a půjček z vlastních zdrojů. Částka ve výši 32.690.000,-- Kč (slovy: třicet dva milionů šest set devadesát tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena Akcionáři/akcionářům společnosti.

Základní kapitál společnosti se snižuje v rozsahu 32.690.000,-- Kč (slovy: třicet dva milionů šest set devadesát tisíc korun českých), tedy z částky 65.380.000,-- Kč (slovy: šedesát pět milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých) na částku ve výši 32.690.000,-- Kč (slovy: třicet dva milionů šest set devadesát tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, kdy představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře společnosti, aby předložili akcie za účelem výměny, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy. Výzvu je představenstvo povinno zveřejnit ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Jedna kmenová akcie znějící na majitele vydaná společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč bude vyměněna za jednu kmenovou akcii znějící na majitele vydanou společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). Jedna kmenová akcie znějící na majitele vydaná společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě 380.000,-- Kč bude vyměněna za jednu kmenovou akcii znějící na majitele vydanou společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě 190.000,-- Kč (slovy: sto devadesát tisíc korun českých).

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 10.10.2013 13:18:35

Obchodní firma: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

Sídlo: **Sokolovská 45/16, 186 00, Praha - Karlín**

Identifikační číslo: **26760312**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Miroslav Douša**

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Jedlička**

Jméno a příjmení: **Ing. Karel Janoch**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **13.02.2003**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Jedlička**

Jméno a příjmení: **Ing. Karel Janoch**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **13.02.2003**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Jedlička**

Jméno a příjmení: **Ing. Karel Janoch**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců**

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Realitní činnost

Velkoobchod

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **13.02.2003**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Jedlička**

Jméno a příjmení: **Ing. Karel Janoch**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **25.09.2013**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: David Bouček

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: David Bouček
Datum narození: 05.02.1968
Občanství: Česká republika
Bydliště: Klapkova 54/21, 182 00, Praha - Kobylisy

Jméno a příjmení: Ing. Martin Jedlička
Datum narození: 19.04.1948
Občanství: Česká republika
Bydliště: Písečná 447/13, 182 00, Praha - Troja

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Douša
Datum narození: 15.07.1955
Bydliště: Šárecká 923/55, 160 00, Praha - Dejvice

Jméno a příjmení: Ing. Karel Janoch
Datum narození: 10.07.1964
Občanství: Česká republika
Bydliště: Černokostecká 101/32, 108 00, Praha - Strašnice

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 8

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Pod pořadovým číslem V-3651/2013, že tato
oprávněná převažuje nad výstupem z informačního
systému veřejné správy v elektronické podobě.
Kladně se stanoví, že výstup z informačního
systému veřejné správy v elektronické podobě.

Dne 10.10.2013

ABĚLAN
ká tajemní
ná notář



0213

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 26990

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.

jméno a příjmení

740624/0457

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

městské inženýrství

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0009459

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 22.11.2005



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Technický dozor investora a správce stavby - vodohospodářské stavby - 2011 - 2013

	IN (v mil. Kč)	Termín	Kontakt
• Trnová – kanalizace obce Trnová – rozšíření	20	2009 – 2011	OÚ Trnová Trnová č. p. 131, 330 13 Trnová p. Koza
• Dobřany – Přírodní koupací biotop Dobřany	25	2009 – 2011	Městský úřad Dobřany Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany Zbyněk Milota
• Lesná – rekonstrukce vodovodního přivaděče a vodojemu Lesná	11	2010 - 2011	Obec Lesná Lesná 1, 347 01 Tachov David Ölveczki
• Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV – správce stavby	667	2011 - dosud	TEPVOS spol. s r. o. Třebovská 287, Ústí nad Orlicí Karel Pražák

V Praze dne 14. 1. 2014

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

d plus®
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8

Profesní životopis

Jméno a příjmení: **Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.**

Dosažené vzdělání: **vysokoškolské**
ČVUT, stavební fakulta (Ing.)
ČVUT, postgraduální studium (Ph.D.)

Celková délka praxe: **15 let**

Přehled dosažené kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky:

Autorizovaný inženýr v oboru:

- **městské inženýrství**
- **stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**

Přehled profesní praxe vztahující se k plnění této veřejné zakázky:

Název akce :	IN (v mil. Kč)	Termín	Kontakt
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Bělohorská, Praha 6	13	2013 - 2014	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Žatecká 2/110, Praha 1 Bc. Petr Malík
• Odstranění povodňových škod z 06/2013 na stokové síti hl. m. Prahy: Výpust 1. pluku, Praha 8	7	2013	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Žatecká 2/110, Praha 1 Luděk Touška
• Protipovodňová opatření Braník, jižní spojka	70	2012 - 2013	Magistrát hl. M. Prahy - ORVP Jungmannova 35/29, Praha 1 Ing. Richard Polifka

V Praze dne 14. 1. 2014

Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.
autorizovaný inženýr



Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 4

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 26990

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.

jméno a příjmení

740624/0457

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru


městské inženýrství

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0009459

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 22.11.2005

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



Profesní životopis

Jméno a příjmení: **Ing. Josef Malý**

Dosažené vzdělání: **vysokoškolské
ČVUT, stavební fakulta (Ing.)**

Celková délka praxe: **32 let**

Přehled dosažené kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky (členství v profesních organizacích):

Autorizovaný inženýr v oboru:

- **pozemní stavby**

Referenční zakázky – výkon technického dozoru investora:

Název akce :	IN (v mil. Kč)	Termín	Kontakt
• Trnová – kanalizace obce Trnová – rozšíření	20	2009 – 2011	OÚ Trnová Trnová č. p. 131, 330 13 Trnová p. Koza

V Praze dne 14. 1. 2014

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8

Císlo C * 123345

DIPLOM

Josef Mařík

8. prosince 1956 v Plzni

narozený(a) dne

stavební

Českého vysokého učení technického v Praze

nabývá podle zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, vysokoškolské kvalifikace

v oboru pozemní stavby

a přiznává se mu (jí) titul inženýr

Ing.

ve zkratce

Praze

dne 4. června 1980



rektor

dekan

SEVT - 26 383 2

Sčt 02 - 5132 79

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 6110

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Josef Malý

jméno a příjmení

561208/1596

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem


v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

0200275

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 07.02.94



Tato úplná kopie o ~~jedné~~ straně ~~je~~ souhlasí

dočasně s prvopisem ~~jedno~~ stránkovým

V Plzni dne 9-01-1996

Věra Bednářová
Věra BEDNÁŘOVÁ pověřená

JUDr. Adéla HEGNEROVÁ

notářkou v Plzni

Václav Mach

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Profesní životopis

Jméno a příjmení: **Ing. Jindřich Škarpíšek**

Dosažené vzdělání: **vysokoškolské
B.A.Sc. (Hons.) stavební inženýrství, University of Toronto (Ing.)**

Celková délka praxe: **40 let**

Přehled dosažené kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky (členství v odborných organizacích):
**Association of Professional Engineers of Ontario (Kanada)
Ordre des ingenieurs du Quebec (Kanada)**

Referenční zakázky – výkon technického dozoru investora – člen týmu správce stavby:

Název akce :	IN (v mil. Kč)	Termín	Kontakt
• Labe – Loučná – správce stavby	700	2007 – 2010	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice Ing. Josef Fedák – generální ředitel
• Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV – správce stavby	667	2011 - dosud	TEPVOS spol. s r. o. Třebovská 287, Ústí nad Orlicí Karel Pražák

V Praze dne 14. 1. 2014

Ing. Karel Janoch
předseda představenstv

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
ŠOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8

This is to Certify that

Andriy Joseph Skarpisak

has fulfilled the requirements of the

University of Toronto

*and has been admitted under the authority of
the Governing Council of the University
of Toronto to the degree of*

Bachelor of Applied Science

*In Witness whereof we have hereto subscribed
our names and affixed the academic seal
of the University*

Don R. Lewis
President

A. J. Thompson
Secretary of the Governing Council



Bernard Stein
Dean

June 4, 1974

KOPIE

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

ŠKOLA: Střední průmyslová škola stavební v Praze 1, Dušní ul.č.17

OBOR: Vodohospodářské stavby

Číslo 36

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: Jindřich Š K A R P Í Š E K

Den, měsíc a rok narození: 4. května 1947

Rodiště: Praha, kraj: Hlavní město Praha

Národnost: česká Státní příslušnost: československá

Maturitní zkoušku vykonal.....

z jazyka českého s prospěchem

z jazyka ruského s prospěchem

z stavebních konstrukcí s prospěchem

z staveb vodních a melioračních s prospěchem

Celkový prospěch: prospěl

V Praze dne 21.června 1966.



[Signature]
předseda maturitní komise

[Signature]
místopředseda maturitní komise

[Signature]
třídní učitel

28

Prohlášení o zaměstnancích

Prohlašujeme, že:

- Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.
- Ing. Josef Malý
- Ing. Jindřich Škarpíšek

jsou zaměstnanci společnosti D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s..

V Praze dne 14. 1. 2014

d plus ©
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

D. Jistota



Pobočka Praha 8 (Sokolovská)
Sokolovská 371/1
186 00 Praha 8

Pokladní doklad/Cash voucher

Heslo pro VK: _____
Password for the Deposit book

Vklad na účet/Deposit in cash

14.01.2014 11:59:00

Číslo účtu/Account number: 0-23734349/0800
Číslo účtu: CZ3408000000000023734349

Měna transakce/Transaction currency: CZK

Částka vkladu/Deposit amount: 10 000,00

Částka slovy/Amount in words: Desettisíc 0/100

Poplatek/Fee: 65,00 CZK

Kurz přepočtu 1/Exchange rate:

Částka přepočtu celkem/Converted amount:

Variabilní symbol/Variable symbol: 26760312

Konstantní symbol/Constant symbol:

Specifický symbol/Specific symbol:

Měna účtu/Currency: CZK

Výčetka

Měna: CZK	vklad	vyběr
Hodnota	ks	ks
5000	2	0
200	1	0
100	0	1
20	0	1
10	0	1
2	0	2
1	0	1

Celkem 10065,00

Podpis klienta/vkladatele
Signature of the bearer/cash recipient

LE 221873 238

Podpis pokladníka
Cashier signature

Šafaříková Anna
002/511/A1037799/226

1/1

1-2109N 01/2014

Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

E. Nabídková cena

Nabídková cena

	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena včetně DPH
Celková nabídková cena	240 000,00 Kč	50 400,00 Kč	290 400,00 Kč

V Praze dne 14. 1. 2014

d plus ©
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

F. Mandátní smlouva



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

MANDÁTNÍ SMLOUVA

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Název: Obec Psáry
sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry
zastoupená ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta obce
IČ: 00241580
Bankovní spojení: 23734349/0800

na straně jedné jako mandant (dále „mandant“)

a

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8

IČ: 26760312 DIČ: CZ26760312

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 8111

bankovní spojení, č.ú.: 581094323/0300 vedený u ČSOB a.s., Praha 1

jednající ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství : Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.

Technický dozor – osoba 1: Ing. Josef Malý (dále TDI 1)

telefon: 377 520 978

e-mail: josef.maly@d-plus.cz

Technický dozor – osoba 2: Ing. Jindřich Škarpíšek (dále TDI 2)

telefon: 221 873 111

e-mail: jindrich.skarpisek@d-plus.cz

na straně druhé jako mandatář (dále „mandatář“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Nabídku mandátáře podanou v zadávacím řízení vyhlášeném mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále „Zákon“) pro zadání veřejné zakázky na provádění služeb – výkon technického pro stavbu „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ vybral mandant jako nabídku nejvhodnější v souladu ust. § 81 Zákona.

(B) Zastupitelstvo obce Psáry schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne pod usnesením č.),

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy (dále jen „Smlouva“) dle ust. § 566 a násl.
Obchodního zákoníku



Článek 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Mandatář se touto Smlouvou zavazuje pro mandanta a na jeho účet za sjednanou úplatu zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „**Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem**“, která je blíže specifikovaná v příslušné projektové dokumentaci, (dále jen „**Stavba**“ nebo též „**Dílo**“), který je mandant povinen zajistit ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a to osobami uvedenými v záhlaví smlouvy. Součástí Stavby je i dobudování vodovodu, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Mandatář bere na vědomí, že účelem této Smlouvy je řádným výkonem sjednané činnosti dosáhnout řádné a včasné realizace stavby v souladu se smlouvou o dílo (včetně příloh) uzavřenou pro zhotovení stavby mezi mandantem a vybraným zhotovitelem (dále jen „**Smlouva o dílo**“), a v souladu s podmínkami pro poskytnutí podpory pro veřejnou zakázku na provedení stavby z Operačního programu Životní prostředí („**Závazné pokyny**“) tak, aby nedošlo ke snížení, pozastavení nebo zrušení podpory a vytvářet tak předpoklady pro definitivní přiznání podpory. Vpředu deklarovaný cíl Smlouvy determinuje rozsah činnosti vykonávané na základě obsahu Zadávací dokumentace a této Smlouvy, jak níže uvedeno.
- 1.2. Mandant se touto Smlouvou zavazuje za činnost mandatáře vykonávanou dle této Smlouvy zaplatit odměnu ve výši a způsobem dle této Smlouvy a poskytnout mandatáři potřebnou součinnost.

Článek 2. Rozsah činnosti mandatáře

Mandatář je povinen provádět následující činnosti:

2.1 Technický dozor nad prováděním Stavby

2.1.1 Fáze výstavby, počínající předáním staveniště zhotoviteli Stavby:

- 1) dokonale se seznámit s realizační projektovou dokumentací stavby vč. oceněného výkazu výměr, místem stavby i příslušnými doklady (stavební povolení atp.) a v tomto smyslu i připravovat v daných termínech i příslušná oznámení, hlášení atp., dodržovat všechny podmínky a ujednání Smlouvy o dílo mezi mandantem a zhotovitelem Stavby, které přísluší výkonu TDI
- 2) schvalovat po předchozím souhlasu mandanta ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami Smlouvy o dílo;
- 3) poskytovat na vyžádání mandanta součinnost zhotoviteli Stavby při získávání potřebných povolení a souhlasů a kontrolovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci Stavby
- 4) protokolárně předávat staveniště zhotoviteli Stavby a pořizovat při tom fotodokumentaci jeho stavu včetně přilehlého okolí;
- 4) sledovat dodržování vydaných správních povolení a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;
- 5) kontrolovat dodržování předpisů požárních a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí zhotovitelem Stavby, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku;
- 6) kontrolovat zda zhotovitel Stavby provádí zkoušky (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení, jejichž provedení je stanoveno příslušnými předpisy, normami



- nebo Smlouvou o dílo) a zajišťovat, aby zhotovitel Stavby vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol a tyto zároveň odborně vyhodnocovat;
- 7) spolupracovat s projektantem - zhotovitelem dokumentace pro provedení Stavby a vyžadovat jeho účast na staveništích k plnění úkolů autorského dozoru – požadavek na výkon autorského dozoru bude mandatář vznášet vždy prostřednictvím mandanta a stejně tak spolupracovat i s koordinátorem BOZP;
 - 8) provádět odborný dohled nad průběhem provádění Díla v souladu se Smlouvou o dílo, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla, způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.), dodržení harmonogramu provádění díla a sjednané ceny díla
 - 9) upozorňovat zhotovitele Stavby na vady provádění Díla a nedodržení harmonogramu provádění Díla;
 - 10) průběžně vyhodnocovat, zda podmínky Smlouvy o dílo jsou v souladu s podmínkami podporovatelnosti z OPŽP - pokud zjistí rozpor nebo potřebu tyto podmínky Smlouvy o dílo doplnit, je mandatář povinen dát okamžitě podněty mandantovi. Mandatář v tomto směru zejména bude kontrolovat, zda podmínkám podporovatelnosti vyhovují dokumenty, které podle podmínek Smlouvy o dílo předkládá zhotovitel Stavby a bude v tomto směru dávat okamžitě podněty mandantovi a upozorní na příp. nedostatky zhotovitele Stavby;
 - 11) kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, pořizovat příslušnou fotodokumentaci a zapisovat výsledky kontroly do stavebního deníku;
 - 12) kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruk odškodnění apod., za které je zhotovitel Stavby odpovědný podle podmínek Smlouvy o dílo;
 - 13) iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny a porady na staveništi v intervalech dle pokynů mandanta, vyhotovovat potřebné zápisy (vč. zapracování korektur a oprav) a čistopisy elektronickou cestou je rozesílat účastníkům;
 - 14) Pokud nebude později stanoveno pokynem mandanta jinak, mandant požaduje, aby se konaly pravidelné porady na staveništi vždy jednou týdně za účasti zhotovitele Stavby, mandatáře a mandanta, mimo tyto termíny budou organizovány kontrolní dny zpravidla jednou za měsíc. Z KD a pravidelných porad bude mandatář zpracovávat zápisy (vč. předložení k odsouhlasení mandantem) a bude je elektronickou cestou rozesílat účastníkům;
 - 15) zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se Smlouvou o dílo, kontrolovat zjišťovací protokoly, za jejichž věcnou správnost mandatář ručí a potvrzovat formální, cenovou a věcnou správnost daňových dokladů;
 - 16) sledovat průběžně, zda se nevyskytla možnost snížení nákladů spojených s prováděním Stavby
 - 17) projednávat se zhotovitelem Stavby a dávat písemná doporučení mandantovi stran sazeb a cen týkajících se prací, jejichž provedení nebylo předvídatelné v době zadání veřejné zakázky na stavební práce;
 - 18) kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení Díla, provozní příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat mandantovi všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem Stavby;
 - 19) kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem ostatní zápisy do tohoto deníku;
 - 20) poskytovat mandantovi poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků mandanta ve vztahu ke zhotoviteli Stavby nebo zhotovitelem Stavby ve vztahu k mandantovi s cílem předcházet vzniku sporů;



- 21) neprodleně podávat mandantovi zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění podmínek podporovatelnosti, zejména v případě rizik, která by mohly ovlivnit splnění podmínek pro poskytnutí podpory včetně např. nárůstu cen, ohrožení včasného dokončení Stavby a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve Smlouvě o dílo;
- 22) zaujmout stanovisko ke každému návrhu zhotovitele Stavby na změnu v provádění Díla, ať již by vyžadovala změnu projektu nebo Smlouvy o dílo či nikoliv, a to z hlediska technického a z hlediska ekonomického – tj. zejména zda navrhované změny nezvyšují náklady Stavby, neprodlužují sjednanou dobu provedení díla, nezhoršují parametry Stavby apod.;
- 23) příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli Stavby
- 24) pořizovat průběžnou fotodokumentaci o postupu a provádění díla a tuto po ukončení předat v elektronické podobě mandantovi
- 25) průběžně informovat mandanta o stavu a průběhu stavby, zejména pak o závažných zjištěních a poznatcích.
- 26) další činnost dozoru je mimo výše uvedeného obsažena v Příloze č. 6 UNIKA, jejíž obsah je pro tento případ závazný

2.1.2 Fáze po skončení výstavby, která počíná přípravou převjímacího řízení

- 1) příprava podkladů potřebných pro řízení o předání a převzetí Díla nebo jeho části, organizace procesu předání a převzetí Díla, před zahájením převjímacího řízení sdělit mandantovi písemně, zda je Dílo schopné převzetí či nikoliv – v tom případě uvede v písemné zprávě důvody tohoto stanoviska;
- 2) kontrola podkladů, které doloží zhotovitel Stavby při převjímacím řízení, zejména doklady a náležitosti, jejichž předložení je podmínkou pro převzetí Díla mandantem;
- 3) provádění prohlídky převzatého Díla v souladu se Smlouvou o dílo. Předání Díla dle Smlouvy o dílo mezi mandantem a zhotovitelem stavby a kontrola odstraňování vad zjištěných při této prohlídce, kontrola vyklizení a úklidu staveniště vč. jeho případného uvedení do náležitého stavu;
- 4) příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli Stavby;
- 5) příprava podkladů pro závěrečné hodnocení Stavby;
- 6) vypracování podkladů potřebných pro činnost společnosti vykonávající investiční dozor tak, jak je uvedeno v odst. 3.3 této Smlouvy.

2.1.3 Fáze od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí do odstranění kolaudačních závad

Dohled nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky mandanta z titulu odpovědnosti zhotovitele Stavby za vady na Díle, spolupráce s mandantem při uplatňování těchto nároků tak, aby pro mandanta byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto nárocích poskytovat mandantovi potřebou součinnost a poradenství, kontrola procesu odstraňování veškerých vad.

2. Mandatář není oprávněn:

- uzavírat dohody o změně Smlouvy o dílo
- uzavírat dohody o změně Díla specifikovaného ve Smlouvě o dílo
- převzít Dílo



- potvrdit odstranění vady či nápravu jiného nedostatku
- uznávat jakékoli pohledávky zhotovitele Stavby vůči mandantovi nebo se vzdávat jakýkoli pohledávek mandanta za zhotovitelem stavby.

Článek 3

Práva a povinnosti mandátáře při plnění Smlouvy

- 3.1. Mandatář je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy mandanta, které zná nebo musí znát. Veškerá činnost mandátáře musí směřovat k zajištění účelu této Smlouvy deklarovaného v článku 1 této Smlouvy, který určuje rozsah činnosti vykonávaný mandátářem dle této Smlouvy.
- 3.2. Mandatář se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této Smlouvy pokyny mandanta, který je zejména oprávněn svým pokynem určit rozsah a obsah činností prováděných mandátářem dle Smlouvy, a to zejména v návaznosti na změnu podmínek podporovatelnosti. Mandant tak svým pokynem může změnit či upřesnit rozsah činnosti dle čl. 2. této Smlouvy. Mandatář se zavazuje, že bude průběžně informovat mandanta o všech okolnostech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta.
- 3.3. Mandant uzavřel smlouvu se společností, se sídlem, zapsanou v OR u dne, oddíl vl., jejímž předmětem je zajištění investičního dozoru. Mandatář se zavazuje spolupracovat s touto společností a na její vyžádání nebo na pokyn mandanta poskytovat potřebné informace a podklady, jakož další potřebnou součinnost.
- 3.4. Mandatář je povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy mandanta věci, které za něho převzal při začátku a během plnění této Smlouvy.
- 3.5. Zjistí-li mandátář při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně mandantovi, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.
- 3.6. Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této Smlouvy do styku, které mandant písemně označí za předmět obchodního tajemství mandanta ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník).
- 3.7. Výchozím podkladem pro činnost mandátáře je tato Smlouva, prováděcí projektová dokumentace stavby „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem“, prováděcí projektová dokumentace stavby „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“, Smlouva o dílo, harmonogram provádění Stavby a nabídkový rozpočet zhotovitele Stavby, které tvoří přílohy 1-4. Smlouvy, aniž by musely být přímo součástí smlouvy. Pokud se dodatečně vyskytne potřeba dalších podkladů či informací, mandátář bez zbytečného odkladu o jejich poskytnutí požádá objednatele.
- 3.8. Mandatář je povinen po celou dobu trvání závazku založeného touto Smlouvou udržovat pojištění odpovědnosti za škody min. tak, jak bylo doloženo v nabídce podané ve výše uvedeném zadávacím řízení.
- 3.9. Mandatář je povinen uhradit veškeré prokazatelné škody způsobené mandátářem při plnění této



smlouvy.

Článek 4. Práva a povinnosti mandanta

- 4.1. Mandant poskytne ke dni účinnosti Smlouvy mandatáři výchozí poklady tak, jak je potvrzeno prohlášením mandátáře obsaženého v ust. odst. 3.7. této Smlouvy. Činnost technického dozoru investora bude vykonávána od převzetí písemné výzvy k zahájení prací a to prostřednictvím osoby TDI 1, kde osoba TDI 2 plní roli alternativní pro osobu TDI 1.
- 4.2. Mandant je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost mandátáře a poskytovat mu během plnění předmětu Smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s předmětem Smlouvy, zejména předat mandatáři další podklady a informace nezbytné pro plnění Smlouvy, které získá po jejím uzavření.
- 4.3. Mandant si vyhrazuje právo odsouhlasení změn osob vykonávajících technický dozor, v případě, že bude Mandatář vykonávat technický dozor prostřednictvím jiných osob, než jsou uvedeny v této smlouvě, je Mandant oprávněn vystavit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé zjištění.

Článek 5. Odměna

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že mandatáři náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy,
 - a) pro výkon činnosti TDI - Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem ve výši:

	120.000,- Kč bez DPH
DPH ve výši 21%	25.200,- Kč
Cena s DPH ve výši	145.200,- Kč
 - b) pro výkon činnosti TDI - a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem ve výši:

	120.000,- Kč bez DPH
DPH ve výši 21%	25.000,- Kč
Cena s DPH ve výši	145.200,- Kč
 - c) Cena celkem
- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| cena celkem za 5.1. a) a 5.1.b) | 240.000,-Kč bez DPH |
| DPH ve výši 21% | 50.400,- Kč |
| Cena s DPH ve výši | 290.400,- Kč |

(dále jen „Odměna“)

K uvedenému odměně bude připočteno DPH, dle platné legislativy.

- 5.2. Odměna zahrnuje veškeré náklady mandátáře, které vynaloží při plnění svého závazku dle této Smlouvy (vč. zajištění záruční doby díla). Nezahrnuje pouze náklady, které vynaložil mandátář při plnění této Smlouvy v zastoupení mandanta, tj. náklady, které by jinak musel vynaložit mandant sám, např. náklady na expertní posudky atd.
- 5.3. Odměnu zaplatí mandant v průběžných měsíčních platbách celkově do výše 90% celkové ceny díla a zbývající část lze vyfakturovat po kolaudaci a předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků a při předchozím bezvadném plnění všech závazků mandátáře. Mandatář
- 5.4. Faktury budou vystavovány vždy k poslednímu pracovnímu dni daného.
- 5.5. Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých daňových dokladů vystavených mandátářem do 30



dnů po jejich doručení mandantovi. Za den úhrady daňového dokladu je smluvními stranami považován den, kdy částka účtovaná daňovým dokladem bude připsána na účet mandatáře.

- 5.6. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

Článek 6. Doba platnosti Smlouvy

- 6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den nabytí účinnosti Smlouvy o dílo mezi zhotovitelem stavebních prací a mandantem a zaniká splněním závazku touto Smlouvou založeného. Splnění závazku bude deklarováno Protokolem o splnění závazku podepsaným mandatářem a mandantem.
- 6.2. Před splněním závazku může být Smlouva ukončena odstoupením kteroukoliv ze smluvních stran v případě, kdy druhá ze smluvních stran neplní závazky založené touto Smlouvou ani v dodatečně poskytnuté lhůtě k plnění. Odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 6.3. Mandant může Smlouvu částečně nebo v celém rozsahu vypovědět a to i před nabytím její účinnosti. Nestanoví-li výpověď mandanta pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní mandatář dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, je však povinen mandanta upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící mandantovi nedokončením činnosti dle této Smlouvy.
- 6.4. Mandatář může smlouvu vypovědět s účinností ke konci třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena mandantovi, nevyplyvá-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti zaniká závazek mandatáře uskutečňovat činnost dle této Smlouvy. Jestliže by tím vznikla mandantovi škoda, je mandatář povinen jej upozornit, jaká opatření učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření nemůže učinit mandant ani pomocí jiných osob a požádá mandatáře, aby je učinil sám, je k tomu mandatář povinen.

Článek 7. Sankce

- 7.1. V případě, že mandatář podstatně poruší tuto Smlouvu, zaplatí mandantovi smluvní pokutu ve výši 1% Odměny vč. DPH za každé takové podstatné porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje opakované neplnění nebo porušování smlouvy ze strany mandatáře.
- 7.2. V případě prodlení mandanta s úhradou Odměny zaplatí mandant mandatáři úrok z prodlení ve sjednané výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. V případě, že se mandatář nezúčastní kontrolního dne nebo pravidelných porad, zaplatí mandantovi smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou neúčast na kontrolním dnu nebo pravidelné poradě.
- 7.4. V případě nečinnosti mandatáře ve lhůtě delší než 3 dne po výzvě mandanta ve věci plnění povinností po záruční dobu díla, zaplatí mandatář smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a den prodlení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Článek 8. Záruka

- 8.1. Mandatář poskytuje záruku za řádný výkon činnosti dle této Smlouvy po dobu záruční lhůty stanovené Zhotovitelem stavby ve Smlouvě o dílo. Počátek běhu záruční lhůty je vymezen dnem, kdy počne běžet záruční doba zhotoviteli stavby a končí dnem, kdy záruka poskytovaná zhotovitelem Stavby skončí. Důkazní břemeno nese mandatář.

Článek 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. V případě, že mandant neobdrží příslušnou dotaci, resp. nebude mít zajištěno financování stavby, je oprávněn od smlouvy odstoupit a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany mandatáře.
- 9.2. Pokud není v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, veškeré změny této Smlouvy je možné provést pouze dohodou ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.
- 9.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Přílohy, aniž by musely být přímo součástí této smlouvy:

1. Projektová dokumentace Stavby – není přímo součástí smlouvy
2. Smlouva o dílo na realizaci Stavby – není přímo součástí smlouvy
3. Harmonogram provádění Stavby – není přímo součástí smlouvy
4. Nabídkový rozpočet zhotovitele Stavby – není přímo součástí smlouvy
5. Pojištění mandatáře odpovědnosti za škody na min. 1 mil. Kč

Mandant: **Obec Psáry**

Mandatář:

V Psárech dne

V Praze dne 14. 1. 2014

.....
Milan Vácha
starosta obce Psáry

.....
Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

d plus ④
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8
